


# Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan Tampereen kehyskunnissa Ohjausryhmälle 2.2.2017

Tampereen kehyskuntien KaPA-projekti

# KaPA käyttöönottoprojekti

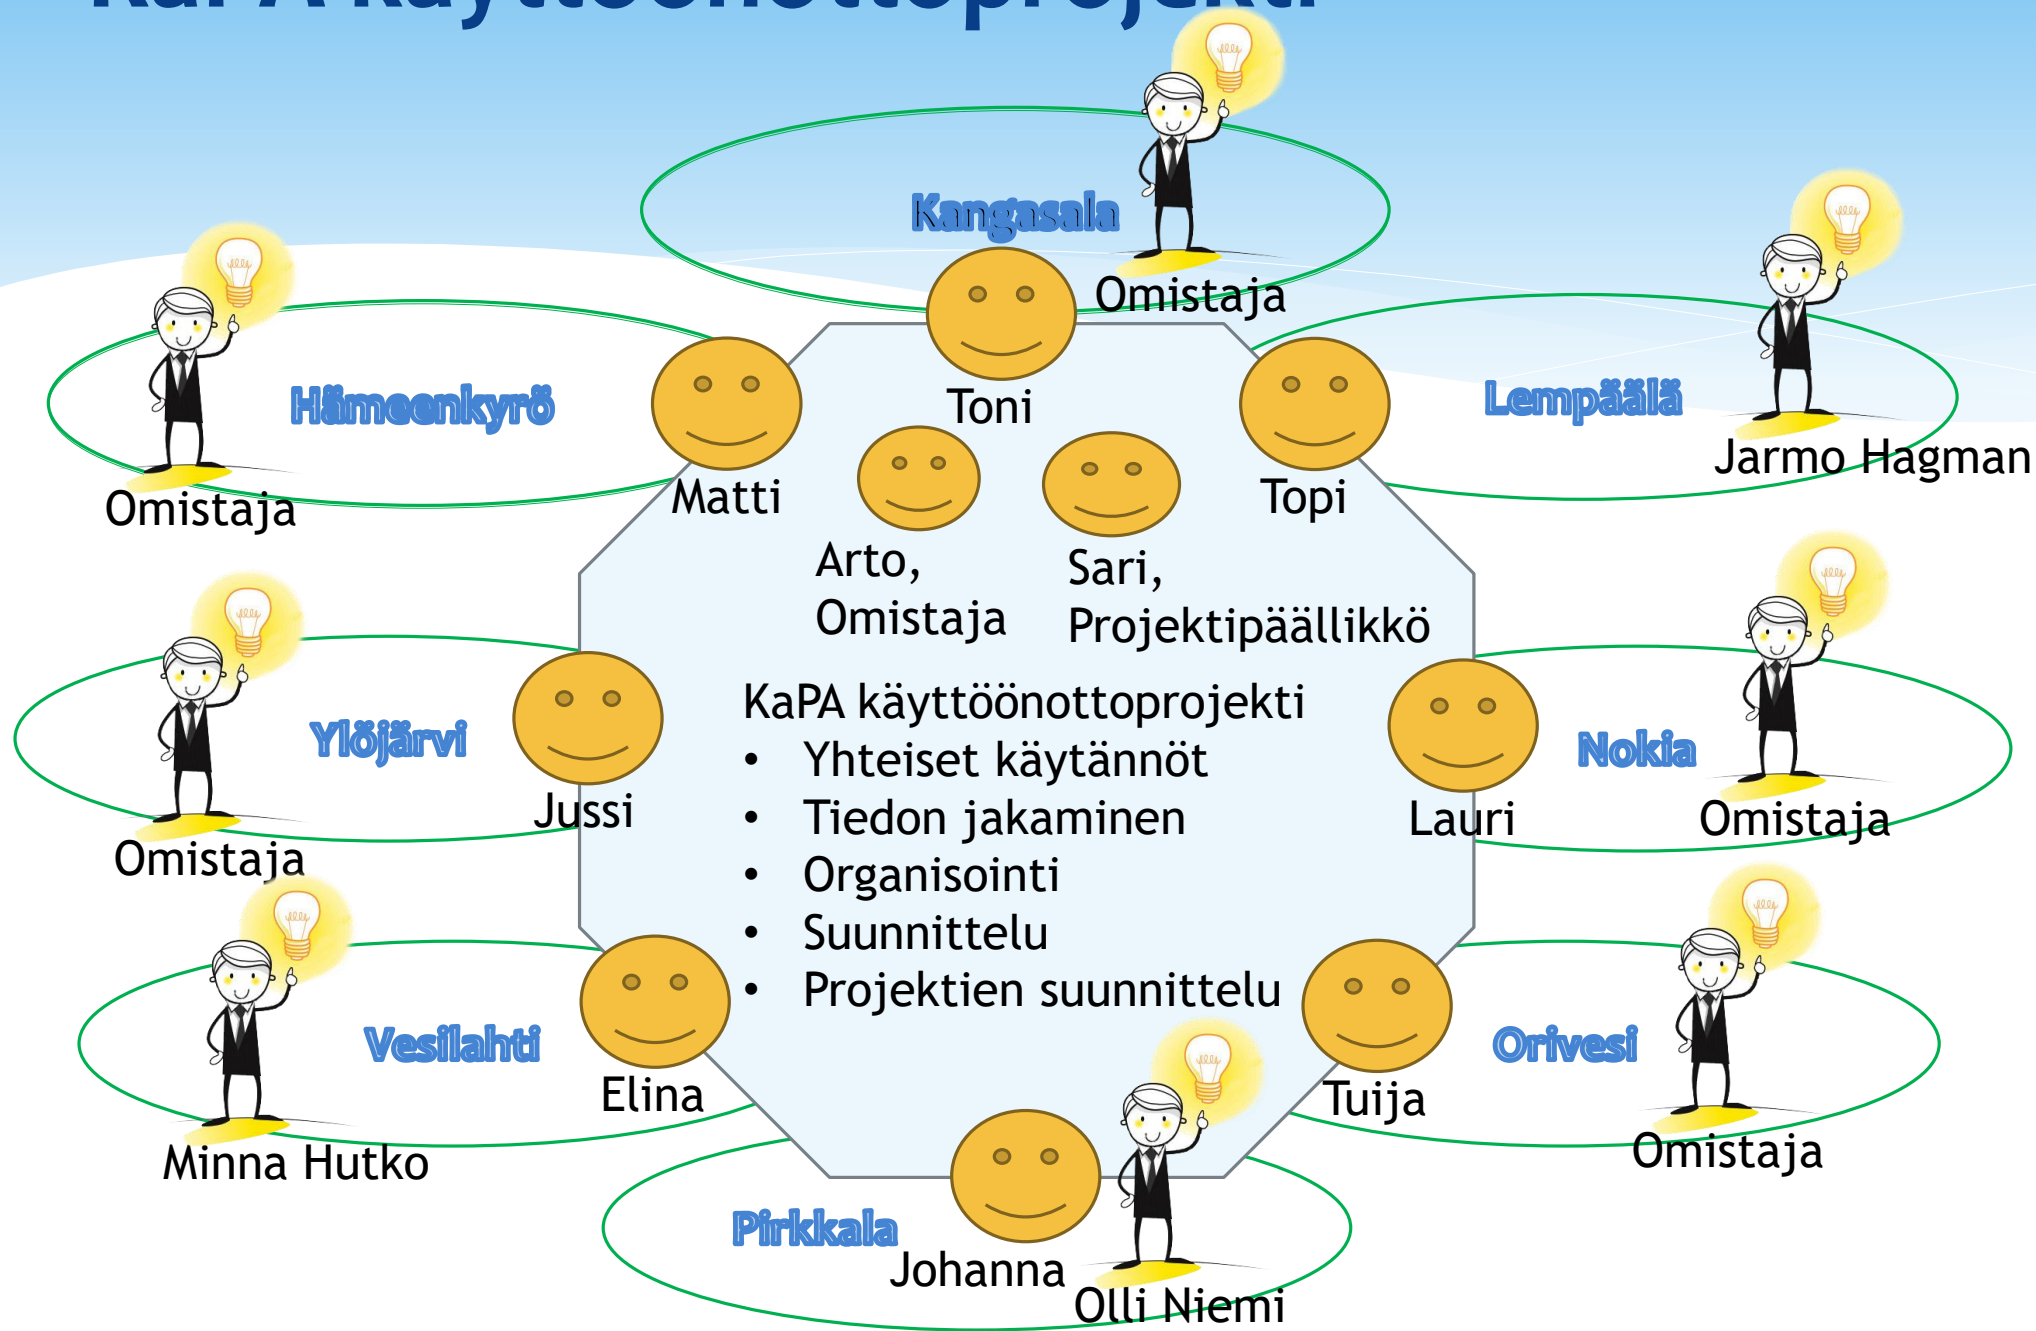

# KaPA-projekti kehyskunnissa

- Kehyskuntien tietohallinto toimii tässä hankkeessa **koordinoijana** ja muutoksen alullepanijana sekä **muutosajurina**
- Kehyskuntien KaPA -hankkeen omistaa tietohallintojohtaja Arto Kahila
- Kustakin kunnasta tarvitaan **kuntakohtainen KaPA-hankkeen omistaja**
  - Johtoon kuuluva henkilö, joka näkee suomi.fi palvelujen mahdollisuudet
  - KaPA -hankkeen ja Suomi.fi -palvelujen puolesta puhuja kunnassa, ei toteuttaja
- Kuntakohtainen projektihenkilö tuo tietoa kuntaan ja ohjaa kuntakohtaisen projektityön
- Lisäksi Tampereen seudun osalta on seudullisessa tietohallinnon johtoryhmässä sovittu, että
  - Palveluväylään liitytään yhdellä seudullisella palvelulla
  - Palvelutietovarannosta pyritään luomaan yhteinen seudullinen konsepti ja hyödyntämään sitä samalla tavalla
  - Palvelunäkymät, Tunnistaminen, Viestinvälityspalvelu, Asiointivaltuudet, Verkkomaksamisen palvelu
    - Liittyminen ja käyttöönotto tehdään järjestelmäkohtaisesti siten, että ne toteutetaan mahdollisimman yhtenäisillä määrityksillä ja vaatimuksilla, joita kaikki seudun kunnan voivat hyödyntää

# Rahoitusta haettu ja saatu VM:ltä Suomi.fi suunnitteluun

Rahoitusta haettiin Kehyskuntien Suomi.fi käyttöönoton suunnitteluun marras-joulukuussa 2016  
Päätöskokous 15.12 päätti myöntää Tampereen kehyskunnille haetun rahoituksen  
Tampereen kehyskunnat haki ja sai suunnittelun rahoitusta seuraavasti:

Vaihe	Työmäärä htp	Kustannus €	VM rahoitus €
Koordinointityö & hankkeen johto & tarkennus - Läpi hankkeen menevä tehtävä	70	58 000 €	43 500 €
Suunnittelu - Nykytila&Suomi.fi	162	38 000 €	28 500 €
Suomi.fi käyttöönottoprojektit suunnittelu	379	89 000 €	66 750 €
<b>Yhteensä</b>	<b>611</b>	<b>185 000 €</b>	<b>138 750 €</b>

Nimi	2016		2017				
	Jouluku	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu
Suunnittelu (Hanke & Nykytila ja Suomi.fi palvelut yhdistys)					31.03.17		
Suomi.fi käyttöönoton suunnittelu			2				
Suunnitteluhankkeiden koordinointi - Hankepääällikkö							

# Suunnitteluvaihe

Tammikuu

Helmikuu-Maaliskuu

Huhtikuu Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Valmiina

## Johtoryhmäinfot

Mitä Suomi.fi palvelut tarjoavat kunnalle

Miten ne otetaan käyttöön

Mitä edellytetään kunnalta

## Nykytilakartoitus

Prosessien läpikäynti toimialoittain

Suomi.fi palveluiden mahdollisuudet toimialoittain

Kehitystarpeet ja mahdollisuudet Suomi.fi palveluilla

Tietojärjestelmät => Tekniset tarpeet

## Suomi.fi osana prosesseja

Suunnitelmat, miten Suomi.fi palveluja hyödynnetään

Suomi.fi palvelujen käyttöönottosuunnitelmat

PTV tiedot tallennettuina

Vetuma tunnistaminen korvattuna

Suunnitelmat Suomi.fi palvelujen käyttöönotosta

Projektisuunnitelmat 2017 alkavista tai tehtävistä projekteista

# Toimialojen läpikäynti

- Kunta aloittaa itselleen tällä hetkellä aktiivisesta/muutoksen alla olevasta/tutuimmasta toimialasta esim.
  - Suunnitellaan/ Tehdään seututason yhteistyötä ja kunta vastuussa ko puolesta
  - Tehdään kehitystyötä parhaillaan, joten käydään läpi joka tapauksessa
  - Projektihenkilölle tuttu toimiala
- Toiset saavat oman työnsä pohjaksi jonkun toisen jo tekemät suunnitelmat, eikä tarvitse tehdä tuplana samaa työtä
- Aloitustoimiala/Kunta, ehdotuksia
  - Kangasala: Varhaiskasvatus - Vastaa seudullisesta kehityksestä
  - Lempäälä: Sivistystoimi - Kehitystä suunnitteilla seututasolla ja kiinnostusta
  - Nokia: Tekninen toimi - Laurille tuttu alue, joten muutkin saavat apuja jatkoa varten

# Rahoitettavat osaprojektit => Valmista 30.6 => 30.8

## PTVn käyttöönotto

- Rahoitus haettu yhteisesti => Rahoituksen seuranta ja raportointi koordinoitusti
- Rahoitus myönnetään kuntien asukasluvun mukaan. Maksimirahoitus Kehyskunnille **70 000€**
  - 10 000€ / kunta: Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi
  - 5 000€ / kunta: Orivesi ja Vesilahti

## Vetuman korvaaminen Suomi.fi tunnistautumisella

- Rahoitus Vetuman käyttömäärien mukaan alle 10 000/kk => max 10 000€/kunta
- Kehyskunnille maksimirahoitus on **60 000€**

Asiakas	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Yhteensä
Kangasalan kunta		0	982	122	522	650	2276
Lempäälän kunta		1	2	96	265	126	490
Nokian kaupunki	0	22	77	334	421	137	993
Pirkkalan kunta	17	7	10	8	7	13	85
Vesilahden kunta		5	29	23	10	9	76
Ylöjärven kaupunki	136	119	105	63	220	311	1259

Muut käyttöönotot tehdään omalla kustannuksella

# Ohjausryhmän päätöspisteet

1. 2.2.2017

- Aloituksen hyväksyminen
  - Suunnitteluhanke aloitettiin 2.1.2017 ja sille on myönnetty VM:ltä rahoitusta
  - PTV:n käyttöönottoon haettiin rahoitusta ja se tulee oletettavasti helmikuussa 2017
  - Vetuman korvaamiseen haettiin rahoitusta ja se tulee oletettavasti helmikuussa 2017
  - Seuraavien ohjausryhmien ajankohdat
- Johtoryhmäinfot -tiedoksi
  - Pidetty: Orivesi, Hämeenkyrö, Nokia-Anne piti itse, Ylöjärvi, Lempäälä
  - Sovittu: Kangasala, Pirkkala, Vesilahti
- Kunnista tarvitaan tekijöiltä aikaa tekemiseen
  - Hyödyntämisen suunnittelu eli nykytila + Suomi.fi palvelut => Tavoitetila / Toimialat
  - PTV käyttöönotto / PTV-pääkäyttäjät
  - Vetuman korvaaminen / Tietohallinto + Pääkäyttäjät, joilla järjestelmissä Vetuma
- Rahoitus saadaan maksuun vain työt tekemällä ja kulut esim. työ kirjaamalla



# Ohjausryhmän päätöspisteet

## 2. Maaliskuun loppupuoli 2017 ja 3. Toukokuu 2017

- Tilannetarkistus
  - Mitä saatu aikaan
  - Miten toiminta mennyt
  - KaPA -projektien huomiointi ja kulujen kirjaus projekteille
  - Rahoituksen seuranta
- Päätettävät asiat, jos tarpeen
  - Projektien esittämät päätöstä vaativat asiat

# Ohjausryhmän päätöspisteet

## 4. Juhannuksen alla / ennen lomia

- Projektien tulosten hyväksyminen, Hyväksyttäväksi tulevat ainakin
  - Projektin tuotokset
    - Yhteenveto Suomi.fi palvelujen käyttöönottoaikatauluista Kehyskunnissa
    - Projektisuunnitelmat 2017 aloitettavista käyttöönotoista
  - Rahoituksen maksatukseen haun perusteet

## 5. Elokuussa varalla kokous, jos jotain jäi kesken ennen lomia

- Projektien tulosten hyväksyminen, Hyväksyttäväksi tulevat ne, joita ei jo hyväksytty edellisessä kokouksessa
  - Projektin tuotokset
    - Yhteenveto Suomi.fi palvelujen käyttöönottoaikatauluista Kehyskunnissa
    - Projektisuunnitelmat 2017 aloitettavista käyttöönotoista
  - Rahoituksen maksatukseen haun perusteet
  - Esitys maksetuksi haettavan suunnittelurahoituksen jakoperusteista ja määristä eri kehyskunnille
